PRACOWNIK
AKTUALIZACJA NA DZIEŃ:

HARMONOGRAM ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Projektowanie drogi rowerowej w ciągu R10 od ul. Barlickiego do granicy miasta z Międzyzdrojami
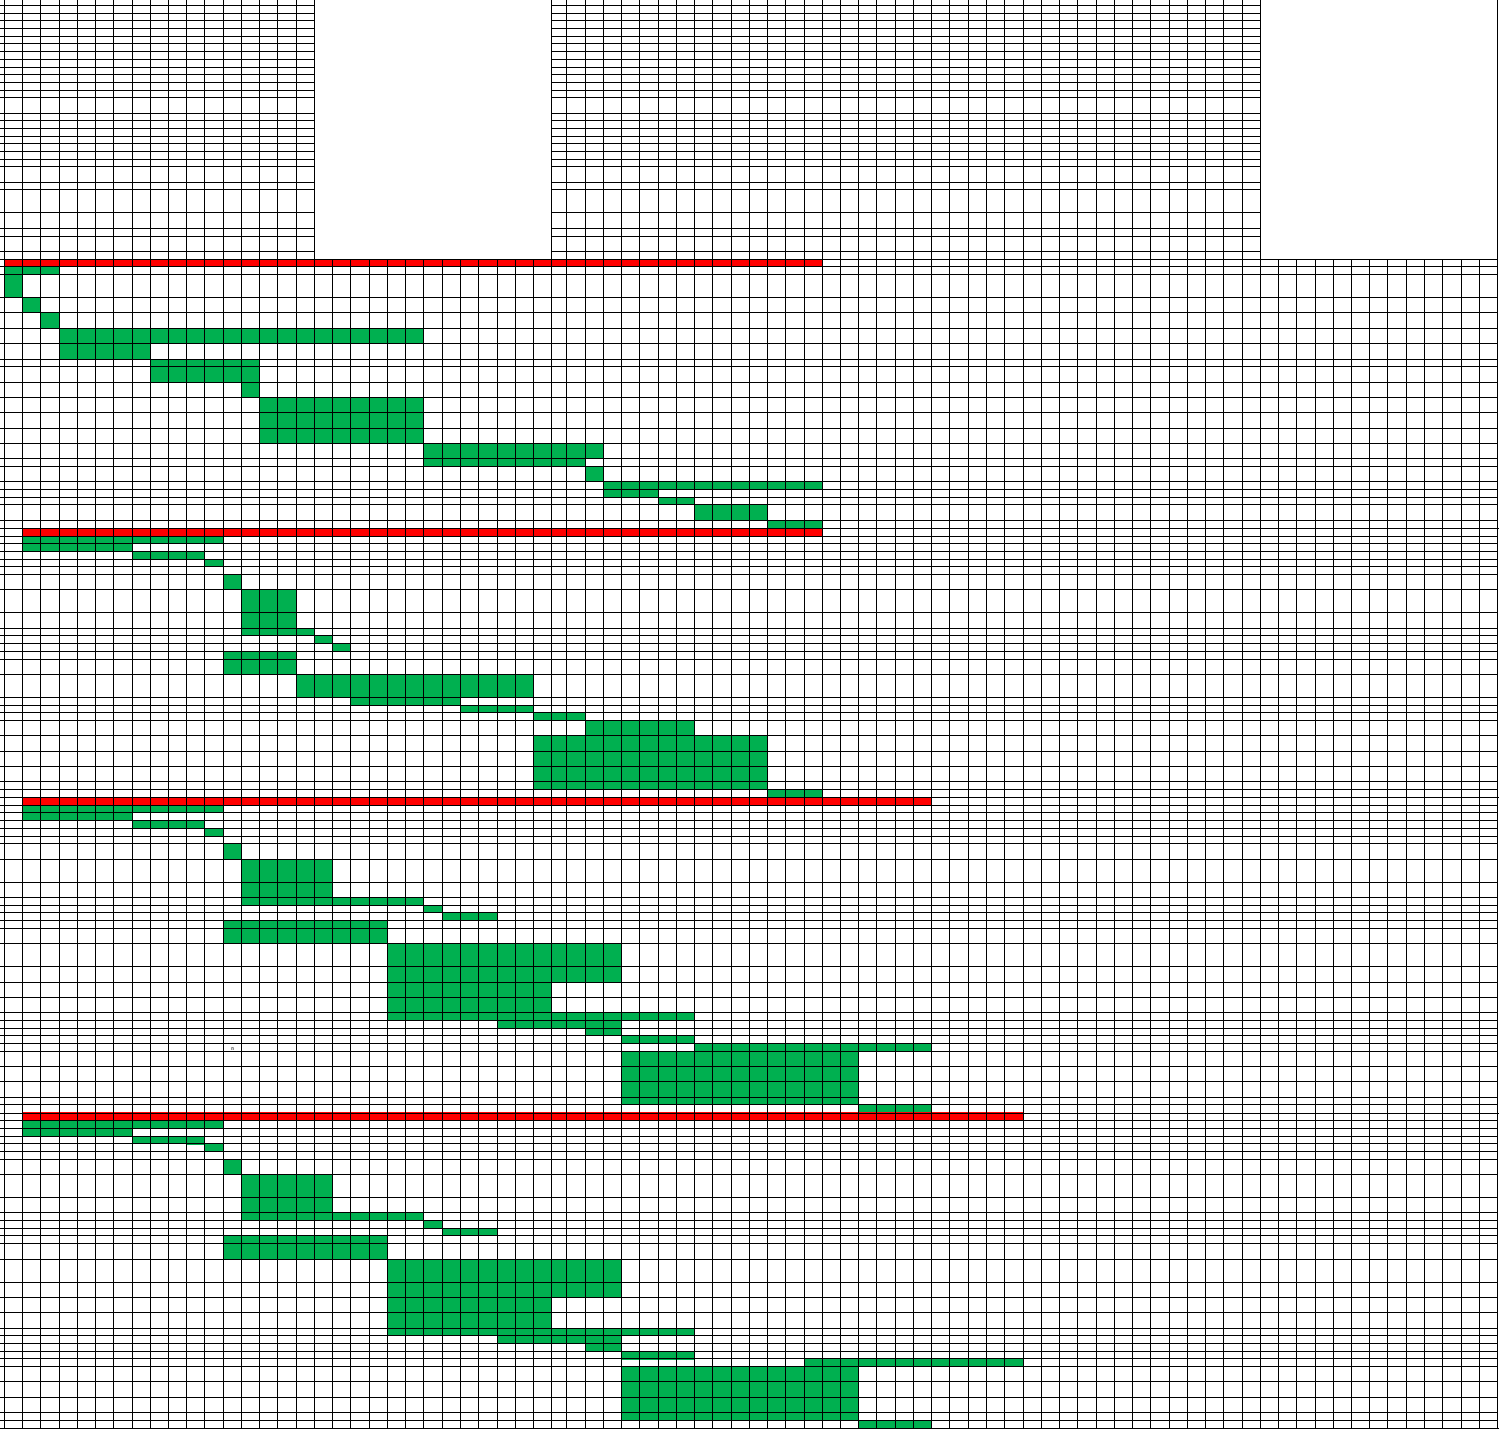
L.p	Zakres - element	Stan zaawansowania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Kwota zaszeowana	Kwota umowna
I	**Czynności przygotowawcze**					
1	Przeszkolenie/koniecznie zamówienia					
2	Wstępne oszacowanie wartości					
3	Zwyczajowanie budżetu					
4	Sprawdzenie stanu własności					
5	Procedurie rządowych działek					
II	**Program funkcjonalno-użytkowy**					
1	Przetarg na wybór wykonawcy					
	Przedstawienie zestrzeszowania					
	Przeprowadzenie postępowania					
	Podpisanie umowy					
2	Opracowanie PFU i WWORB					
	Przekazanie posiadanych materiałów wykonawcy					
	Opracowanie założeń do PFU (wraz z koncepcją wstępną)					
	Uzgodnienie założeń i koncepcji wstępnej					
	Mapa i wersja z mapą					
	Oświadczenie o zgodzie do dysponowania gruntem					
	Mapa mapy zasadnicze					
	Wyceń budżet przyjmowa - wodnych					
	Zalecenia konserwatorskie					
	Inwentaryzacja zieleni					
	Dane środowiskowe - m.in. KIP, ekspertyzy, raporty itp.					
	Pomiary ruchu, hałasu i innych uciążliwości					
	Inwentaryzacja obiektów i uzbrojenia podziemnego oraz wskazania ich dotyczące - rozbiórka, przebudowa, itd.					
	Uzgodnienia i warunki przyłączenia do mediów, dróg itp.					
	Dodatkowe wytyczne - konieczne, wskazania itp.					
	Obliczenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych					
	Odbiór PFU z WWORB					
I	**Opracowanie zmiany mpzp w rejonie ul. Wolińskiej**					
1	Wznowienie prac i wstępne uzgodnienia		2020-06-09	2020-06-26		
	Przedanie rysunku z poprawkami do uzgodnień roboczych z ZMPGiG, Urzędem Morskim, Nadleśnictwem i GDDKiA			2020-06-15		
	Uzyskanie opinii roboczych oraz uzgodnienie z WIM parametrów drogi			2020-06-23		
	Przekazanie roboczych opinii oraz wytycznych zmieniających stanu			2020-06-26		
2	Korekta projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko					
	Przygotowanie kompletu materiałów do wysyłki do uzgodnienia i zainiowania		2020-06-29	2020-07-31		
	Uzyskanie opinii i uzgodnień od instytucji		2020-08-01	2020-09-15		
	Korekta projektu planu i prognozy. Przygotowanie wniosku końcowy		2020-08-01	2020-09-15		
	Wystąpienie z wnioskiem o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.			2020-09-15		
	Uzyskanie decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów leśnych	KLUCZOWE	2020-09-15	2020-11-16		
	Przygotowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp		2020-09-15	2020-11-16		
	Przygotowanie kompletu materiałów do wyłożenia mpzp		2020-09-15	2020-11-16		
3	Wyłożenie projektu planu; dyskusja publiczna i aktualizacja planu		2020-11-17	2021-01-22		
	Składanie i rozstrzyganie uwag		2020-11-17	2021-01-15		
	Aktualizacja projektu planu i prognozy zgodnie z rozstrzygnięciem Prezydenta		2021-01-15	2021-01-22		
4	Zatwierdzenie mpzp w rejonie ulicy Wolińskiej		2021-01-23	2021-04-14		
	Przekazanie do BRM		2021-01-23	2021-02-05		
	Uchwalenie - sesja RM		2021-02-06	2021-02-28		
	Weryfikacja przez Wojewodę i publikacja w dzienniku urzędowym		2021-03-01	2021-03-31		
	Wejście w życie - prawomocność		2021-03-31	2021-04-14		
II	**Projektowanie odcinka 1 - droga rowerowa wzdłuż ulicy Wolińskiej (od skrzyżowania z ul. Barlickiego do skrzyżowania z ul. Sąsiedzką)**					
1	Przetarg na wybór projektanta		2020-06-15	2020-08-30		
	Przygotowanie postępowania		2020-06-15	2020-07-05		
	Przeprowadzenie postępowania		2020-07-06	2020-08-16		
	Podpisanie umowy		2020-08-17	2020-08-30		
2	Opracowanie projektu budowlanego					
	Przekazanie posiadanych danych i materiałów oraz wytycznych/warunków zamawiającego		2020-08-31	2020-09-06		
	Rozpoznanie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, uzyskanie warunków i inwentaryzacja istniejących obiektów		2020-09-07	2020-09-27		
	Badania geologiczno-inżynierskie oraz geotechniczne warunki posadowienia		2020-09-07	2020-09-27		
	Opracowanie koncepcji		2020-09-07	2020-10-04		
	Prezentacja koncepcji		2020-10-05	2020-10-11		
	Weryfikacja i zatwierdzenie koncepcji		2020-10-12	2020-10-18		
	Mapa do celów projektowych		2020-08-31	2020-09-27		
	Inwentaryzacja przyrodnicze (zieleni, siedlisk, flory, fauny) oraz opracowanie KIP		2020-08-31	2020-09-27		
	Uzyskanie DŚU i ewentualnie innych decyzji przyrodniczych (wycinkę drzew, zniszczenie siedlisk itp.)	KLUCZOWE	2020-09-28	2020-12-27		
	Sporządzenie projektu budowlanego		2020-10-19	2020-11-29		
	Uzgodnienia - narada koordynacyjna ZUDPI		2020-11-30	2020-12-27		
	Odbiór projektu budowlanego		2020-12-28	2020-01-17		
3	Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę		2020-12-28	2021-03-28		
4	Opracowanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach		2020-12-28	2021-03-28		
5	Opracowanie przedmiaru robót dla wszystkich branż		2020-12-28	2021-03-28		
6	Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż		2020-12-28	2021-03-28		
7	Opracowanie STWORB dla wszystkich branż		2020-12-28	2021-03-28		
8	Odbiór końcowy dokumentacji projektowej		2021-03-29	2021-04-28		
III	**Projektowanie odcinka 2 - wspólnego z drogą w kierunku plaży przy Podziemnym Mieście (od przejazdu kolejowego przy ul. Sąsiedzkiej)**					
1	Przetarg na wybór projektanta		2020-06-15	2020-08-30		
	Przygotowanie postępowania		2020-06-15	2020-07-05		
	Przeprowadzenie postępowania		2020-07-06	2020-08-16		
	Podpisanie umowy		2020-08-17	2020-08-30		
2	Opracowanie projektu budowlanego					
	Przekazanie posiadanych danych i materiałów oraz wytycznych/warunków zamawiającego		2020-08-31	2020-09-06		
	Rozpoznanie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, uzyskanie warunków i inwentaryzacja istniejących obiektów		2020-09-07	2020-10-11		
	Badania geologiczno-inżynierskie oraz geotechniczne warunki posadowienia		2020-09-07	2020-10-11		
	Opracowanie koncepcji		2020-09-07	2020-11-15		
	Prezentacja koncepcji		2020-11-16	2020-11-22		
	Weryfikacja i zatwierdzenie koncepcji		2020-11-23	2020-12-14		
	Mapa do celów projektowych		2020-08-31	2020-11-01		
	Inwentaryzacja przyrodnicze (zieleni, siedlisk, flory, fauny) oraz opracowanie KIP		2020-08-31	2020-11-01		
	Uzyskanie DŚU i ewentualnie innych decyzji przyrodniczych (wycinkę drzew, zniszczenie siedlisk itp.)	KLUCZOWE	2020-11-02	2021-01-31		
	Szacunek brakarski oraz decyzja o wyłączeniu z produkcji leśnej	KLUCZOWE	2020-11-02	2021-01-31		
	Decyzja na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne	KLUCZOWE	2020-11-02	2021-01-03		
	Decyzja zwalniająca z zakazów na obszarach zamkniętych ruchu	KLUCZOWE	2020-11-02	2021-01-03		
	Operat wodnoprawny i sporządzenie wodnoprawne	KLUCZOWE	2020-11-02	2021-02-28		
	Sporządzenie projektu budowlanego		2020-12-14	2021-01-31		
	Uzgodnienia - narada koordynacyjna ZUDPI		2021-01-18	2021-01-31		
	Odbiór projektu budowlanego		2021-02-01	2021-02-28		
3	Decyzja ZRID		2021-02-01	2021-05-02		
4	Opracowanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach		2021-02-01	2021-05-02		
5	Opracowanie przedmiaru robót dla wszystkich branż		2021-02-01	2021-05-02		
6	Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż		2021-02-01	2021-05-02		
7	Opracowanie STWORB dla wszystkich branż		2021-02-01	2021-05-02		
8	Odbiór końcowy dokumentacji projektowej		2021-05-03	2021-05-30		
IV	**Projektowanie odcinka 3 - ciąg pieszo - rowerowy od Podziemnego Miasta (granicy z Międzyzdrojami)**					
1	Przetarg na wybór projektanta		2020-06-15	2020-08-30		
	Przygotowanie postępowania		2020-06-15	2020-07-05		
	Przeprowadzenie postępowania		2020-07-06	2020-08-16		
	Podpisanie umowy		2020-08-17	2020-08-30		
2	Opracowanie projektu budowlanego					
	Przekazanie posiadanych danych i materiałów oraz wytycznych/warunków zamawiającego		2020-08-31	2020-09-06		
	Rozpoznanie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, uzyskanie warunków i inwentaryzacja istniejących obiektów		2020-09-07	2020-10-11		
	Badania geologiczno-inżynierskie oraz geotechniczne warunki posadowienia		2020-09-07	2020-10-11		
	Opracowanie koncepcji		2020-09-07	2020-11-15		
	Prezentacja koncepcji		2020-11-16	2020-11-22		
	Weryfikacja i zatwierdzenie koncepcji		2020-11-23	2020-12-14		
	Mapa do celów projektowych		2020-08-31	2020-11-01		
	Inwentaryzacja przyrodnicze (zieleni, siedlisk, flory, fauny) oraz opracowanie KIP		2020-08-31	2020-11-01		
	Uzyskanie DŚU i ewentualnie innych decyzji przyrodniczych (wycinkę drzew, zniszczenie siedlisk itp.)	KLUCZOWE	2020-11-02	2021-01-31		
	Szacunek brakarski oraz decyzja o wyłączeniu z produkcji leśnej	KLUCZOWE	2020-11-02	2021-01-31		
	Decyzja na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne	KLUCZOWE	2020-11-02	2021-01-03		
	Decyzja zwalniająca z zakazów na obszarach zamkniętych ruchu	KLUCZOWE	2020-11-02	2021-01-03		
	Operat wodnoprawny i sporządzenie wodnoprawne	KLUCZOWE	2020-11-02	2021-02-28		
	Sporządzenie projektu budowlanego		2020-12-14	2021-01-31		
	Uzgodnienia - narada koordynacyjna ZUDPI		2021-01-18	2021-01-31		
	Odbiór projektu budowlanego		2021-02-01	2021-02-28		
3	Pozwolenie na budowę		2021-02-01	2021-05-02		
4	Opracowanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach		2021-02-01	2021-05-02		
5	Opracowanie przedmiaru robót dla wszystkich branż		2021-02-01	2021-05-02		
6	Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż		2021-02-01	2021-05-02		
7	Opracowanie STWORB dla wszystkich branż		2021-02-01	2021-05-02		
8	Odbiór końcowy dokumentacji projektowej		2021-05-03	2021-05-30
